

Pasūtītājs:

Ventspils brīvostas pārvalde

Reģ. Nr.

LV90000284085

Adrese:

Jāņa iela 19, Ventspils

Līguma Nr.

VBOP 2013/159

Būvprojekta nosaukums:

**Ventspils brīvostas
piestātnes Nr. 25 renovācija**

Adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 6, Ventspils

Sējums:

5. SĒJUMS Darbu organizācija (DOP)

Projekta stadija:

Tehniskais projekts

*Uzņēmuma vadītājs/
Būvprojekta vadītājs:*

J.Rāzna

*Būvprojekta DOP daļas
vadītāja:*

V.Alekna-Bērziņa

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

1. SĒJUMS VISPĀRĪGĀ DAĻA. ĢENERĀLPLĀNS
(Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti. Paskaidrojuma raksts. Ģenerālplāns.
Tehniskās apsekošanas akts)
2. SĒJUMS BŪVKONSTRUKCIJAS
(1. kārtā. Piestātnes esošās fasādes sienas saduru vietu atjaunošana starp čaulpāļiem)
3. SĒJUMS BŪVKONSTRUKCIJAS
(2. kārtā. Piestātnes esošās fasādes sienas dzelzsbetona čaulpāļu remonts, dzelzsbetona
virsbūves renovācija)
4. SĒJUMS BŪVKONSTRUKCIJAS
(3. kārtā. Piestātnes kuģu atvairlementu (fenderu) sistēmas renovācija)
5. SĒJUMS **DARBU ORGANIZĀCIJA**
6. SĒJUMS EKONOMIKAS DAĻA (tikai 1. un 3. eksemplārā)
(Būvdarbu izmaksu aprēķins)

SĒJUMA SATURS

1.	Paskaidrojumu raksts.....	4
1.1.	Esošās situācijas apraksts	4
1.2.	Darbu veikšanas projekts	4
1.3.	Sagatavošanās darbi	4
1.4.	Darbu secība	5
1.5.	Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana	5
1.6.	Vides aizsardzības pasākumi	6
2.	Drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumi. Darba aizsardzības plāns.	7
2.1.	Vispārīgie norādījumi	7
2.2.	Iespējamie riski un pasākumi, kas veicami risku samazināšanai/novēršanai	8
	Rasējumi	10

1. Paskaidrojumu raksts

1.1. Esošās situācijas apraksts

Renovējamā piestātne atrodas Ventas upes kreisajā krastā starp piestātņi Nr. 25B un Nr.25A Kr.Valdemāra ielā 6. Projektētā platība ir izvietota zemes gabala ar kad.Nr. 27000010905 robežās.

Objektam iespējams piekļūt no Kr.Valdemāra ielas un no Ventas upes.

1.2. Darbu veikšanas projekts

Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, būvuzņēmējam ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts (turpmāk DVP).

DVP ir izstrādājams un saskaņojams ar Pasūtītāju atbilstoši LBN 310-05 "Darbu veikšanas projekts", pamatojoties uz šo Darbu organizēšanas projektu un būvprojektu kopumā.

Izstrādājot DVP papildus ir jāņem vērā šādi normatīvie dokumenti:

- Darba likums;
- Būvniecības likums;
- Darba aizsardzības likums;
- Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”;
- MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi”;
- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”;
- MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi”;
- MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu, darba aizsardzību un ugunsdrošību;
- LR “Darba aizsardzības likumu” ar tā papildinājumiem
- MK noteikumi Nr.379 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.
- MK noteikumi Nr.125 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

Izstrādājot DVP būvuzņēmējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, izpildes metodes ņemot vērā ūdens līmeņa svārstības un viļņošanās, kā arī vējš, prasības kas ir minētas BK daļas paskaidrojuma rakstā, jāizstrādā detalizēts laika grafiks, kā arī jāizstrādā un jāaskaņo ar attiecīgām institūcijām satiksmes organizēšanas plāns.

Būvuzņēmējam savās darbu izmaksās ir jāievērtē arī visu darbu veikšanai nepieciešamo atļauju (būvatļauja u.tml.) un saskaņojumu saņemšanas izmaksas.

1.3. Sagatavošanās darbi

- 1) Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic ietekmējamās teritorijas rūpīga apsekošana un demontējamo elementu identificēšana.
- 2) Būvlaukuma materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukuma ierīkošana un labiekārtošana (ģērbtuvju, sanitāro mezglu ierīkošana) uz piestātnes (skat. lapu DOP-1, apzīmējums 1), tajā skaitā būvlaukuma norobežojošā žoga uzstādīšana.
- 3) Nepieciešamo elektropieslēguma vietu noteikšana, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķa skaitītāja uzstādīšana. Būvuzņēmējs autonomai elektroapgādei var izmantot arī mobīlos ģenerātorus.
- 4) Būvdarbu procesā ir jāveic izmantojamo materiālu krautņu vietu norādīšana un nepieciešamības gadījumā arī to sagatavošana, t.i virsmas atbrīvošana no traucējošiem elementiem (būvgružiem, akmeņiem u.t.t.) un nolīdzināšana.
- 5) Gan būvlaukuma pilsētiņai, gan pašam būvlaukumam diennakts tumšajā laikā ir jābūt apgaismotam.

1.4. Darbu secība

Būvuzņēmējam visus darbu procesus, kas ir minēti šajā punktā (izstrādājot DVP) ir iespējams sadalīt vēl sīkāk, ievērojot galveno darbu procesu secību.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par objekta nodrošināšanu ar pietiekamu tehnikas un iekārtu daudzumu kvalitatīvai un drošai darbu veikšanai.

Ja būvdarbi tiek veikti pa kārtām vairākās sezonās, būvuzņēmējam jārēķinās ar nepieciešamību veikt mobilizācijas un demobilizācijas darbus katras no kārtām realizācijai, kā arī būvlaukuma sakārtošanas pēc būvdarbu pabeigšanas. Katrai no būvniecības kārtām ir izstrādājams atsevišķs Darbu veikšanas projekts.

1. kārtā – piestātnes esošās fasādes sienas saduru vietu atjaunošana starp čaulpāļiem

Remontu paredzēts veikt saduru vietām starp čaulpāļiem vietās, kur apsekošanas laikā tika konstatēta grunts noplūde.

Remonta laikā paredzēts:

- apsekot bojājuma vietas;
- demontēt esošo koka veidņu atliekas;
- demontēt vāji saistīto saduru šuvju aizpildījuma betonu un vāji saistīto šuvju pildījumu, kas izveidots agrākos remontos;
- gultnes attīrīšana līdz atzīmei -6.5 m bojājumu vietās;
- tērauda vairoga montāža;
- gultnes piebēršana līdz atzīmei -6.0 ar šķembām;
- dobumu aizpildīšana aiz vairogiem ar betonu.
- attīrīt gultni 20m platā zonā gar piestātņi.
- Paredzēts atrakt enkursienas izkliedsiju un veikt remontu vietās, kur enkursavilces nav pietiekami nostiprinātas.

2. kārtā – piestātnes esošās fasādes sienas dzelzsbetona čaulpāļu remonts, dzelzsbetona virsbūves renovācija

- Dzelzsbetona virsbūves remonts virsūdens daļā. Betona virsbūvē defektu vietās – betona izdrupumi, atsegts stiegrojums, kavernas, nekvalitatīvs betonējums, plaisas, paredzēts attīrīt virsmu un remontēt ar remontjavu. Virsmu paredzēts pārklāt ar aizsargpārklājumu.
- Čaulpāļu betona remonts.
- Tērauda rievsienu pretkorozijas apstrāde.

3. kārtā – „Piestātnes kuģu atvairielementu (fenderu) sistēmas renovācija”

Esošās atvairierīces paredzēts demontēt un piestātņi aprīkot ar 1.5m garām arkveida atvairierīcēm ar soli ~6m un kāpnēm.

1.5. Kalendārais grafiks

Būvuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas sastāda izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku atbilstoši noslēgtā būvdarbu līguma nosacījumiem. Darbaspēka, mehānismu un būvmateriālu plūsma jāplāno tā, lai būvniecība iekļautos plānotajos termiņos:

- Savlaicīgi jāveic sagatavošanas darbi - DVP izstāde, materiālu saskaņošana, darba programmu izstrāde un saskaņošana, darba rasējumu sagatavošana un saskaņošana;
- Jāplāno būvdarbu mehānizācija un tehnoloģija;
- Jāizmanto plūsmas metode būvdarbu tehnoloģisko procesu veikšanai.

1.6. Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana

Katrs darbu process ir izpildāms atbilstoši šī projekta tehniskajās specifikācijās sniegtajām norādēm, par ko tiek sastādīti segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. Darbu izpildei pieļaujams izmantot tikai tādus materiālus, kas atbilst specifikāciju

prasībām, par ko liecina materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas ar pielikumā pievienoto ražotāja izsniegto kvalitāti apliecinošo sertifikātu.

Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga klātbūtnē. Nav pieļaujama situācija, kad tiek uzsākta nākamā darbu procesa izpilde, kamēr par iepriekšējo darbu nav parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Saskaņotās izmaiņas ir reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā.

Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, būvuzņēmējam ir jāpieaicina sertificēts/licencēts mērnieks, kas veic izpildmērījumus, un šo izpildmērījuma plānu pievieno pie objekta izpilddokumentācijas.

Pēc visu krasta nostiprinājumu labiekārtošanas darbu pabeigšanas objekts ir jāatbrīvo no materiālu atlikumiem, būvgružiem, informatīviem plakātiem un ceļa zīmēm, tehnikas u.tml. Būvlaukuma pilsētiņa jādemobilizē. Būvdarbu laikā visas skartās teritorijas ir jāsakopj, zālāji jārekultivē un objekts kopumā ir uzrādāms Pasūtītāja pārstāvim un/vai būvuzraugam, kā rezultātā var tikt sagatavots apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā.

1.7. Vides aizsardzības pasākumi

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības likuma noteikumus un nepieļautu tās piesārņošanu. Veicot būvdarbus būvuzņēmējam jāņem vērā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi.

Būvniecības darbu procesā ir jāpielieto tādas darbu izpildes metodes, kas nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, t.i.:

- darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm,
- peldlīdzekļiem ir jābūt nodrošinātiem ar materiāliem (sorbetiem), ar kuru palīdzību nepieciešamības gadījumā var operatīvi lokalizēt degvielas un smērvielu noplūdi,
- mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt pēc iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību skaitu objektā, kas savukārt būtiski nepalielina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem.

Darbu izpildē ir izmantojami apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Būvmateriālu iesaiņojuma materiāli un citi būvniecības darbu procesā radušies atkritumi ir jāsavāc konteineros un jānodod attiecīgo atkritumu apsaimniekotājiem.

Būvprojekta DOP daļas vadītāja:

Vineta Alekna-Bērziņa

2. Drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumi. Darba aizsardzības plāns.

2.1. Vispārīgie norādījumi

Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs šim būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot un nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar atrašanos būvlaukumā.

Pirms darbu uzsākšanas, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, ir norīkojams atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir, vai nav, nozīmējis darba aizsardzības koordinatoru). Atbildīgajai personai licencētā mācību iestādē ir veicama atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, un ir apliecināti dokumenti/apliecības (LR MK noteikumi Nr.323 „Noteikumi par apmācību darba aizsardzība jautājumos”).

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža. Darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktažu/ apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam ir nozīmēts atbildīgais Būvdarbu vadītājs), saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu NR.323 “Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai ir apzinātas visas esošās komunikācijas - elektrolīnijas, sakaru gaisa un zemes kabeli, ūdens un kanalizācijas caurules u.c.

Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt uz darba vietām tehnoloģiskā secībā, lai tādējādi nodrošinātu darba drošību.

Jebkādas iekārtas būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā.

Būvlaukumā lietotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju apliecināti dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecināti dokumenti/apliecības/sertifikāti.

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (speciālais apģērbs, apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas metodes un paņēmienus.

Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.125 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasības.

Sanitār-sadzīves telpām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai līdz būvdarbu uzsākšanai. Telpās ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri būtu nepieciešami cietušajiem pie pirmās palīdzības sniegšanas.

Būvuzņēmējam noteikti jāorganizē darbinieku apmācību/instruktažu, par drošu smagumu celšanu/pārvietošanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” prasībām.

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības inventāru, ugunsdzēsamiem aparātiem, glābšanas riņķiem un šo inventāru izmantošanas noteikumiem nepieciešamības gadījumā.

Būvniecības laukumā ir jābūt telefonu sakariem, lai varētu izsaukt glābšanas dienestus un neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Iebraucot būvlaukumā ir jābūt uzstādītai celtniecības laukuma shēmai. Grafiskie nosacījumi apzīmējumi ar atspoguļotām demontējamām būvēm, palīgēkām, izbrauktuvēm, piebrauktuvēm.

Būvlaukuma teritorijā smēķēšana ir atļauta tikai speciāli atvēlētās vietās.

2.2. Iespējamie riski un pasākumi, kas veicami risku samazināšanai/novēršanai

Nr. p.k.	Iespējamie riski	Pasākumi riska samazināšanai/novēršanai
1.	Darbinieku iekrišana ūdenī.	1.1. Darbiniekam, kas darbojas ūdens tuvumā vai uz ūdens, obligāti jānēsā glābšanas veste, bet darba platformai (piem.pontons) ir jābūt aprīkotai ar glābšanas riņķi. 1.2. Darbi veicami min.3 cilvēku grupā.
2.	Trauma no atlecošām šķembām.	2.1. Veicot tērauda griešanas darbus ir iespējams gūt traumu no atlecošām šķembām. Darbiniekam ir jālieto aizsargbrilles, aizsargapģērbs, speciāli apavi un darba cimdi.
3.	Trauma iekārtas neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā.	3.1. Darbu vadītājs pārliecinās par visu darba iekārtu gatavību darbam, pirms tās tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei. 3.2. Iekārtas kas aprīkotas ar spiedienu mērīšanas ierīcēm (manometri) ir jābūt derīgiem pārbaudes dokumentiem saskaņā ar likumu par bīstamo iekārtu ekspluatāciju. 3.3. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra veicamā darba specifiku un izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. 3.4. Darbiniekiem ir jābūt apmācītiem darbam ar katru konkrēto darba iekārtu/ierīci.
4.	Trauma no krītoša priekšmeta	4.1. Darbiniekam darba zonā obligāti jānēsā tam izsniegtie individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargķive, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi u.t.t.). 4.2. Brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst atrasties zem ceļamās kravas, vai celtņa izlices. 4.3. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši atestēts un ir atbildīgs par kravu stropēšanu.
5.	Trauma no neatbilstošas ūdenslīdēju aprīkojuma ekspluatācijas un neievērojot darba drošības instrukcijas.	5.1. Ūdenslīdēju birigādes vadītāja pienākums instruēt darba veicējus par katra konkrētā zemūdens darba specifiku un par pasākumiem, kas ir ievērojami darbu izpildes laikā. 5.2. Ūdenslīdējiem ir jābūt derīgām, kvalifikāciju apliecinošām, apliecībām. 5.3. Ūdenslīdēju aprīkojumam ir jābūt pārabadītam atbilstoši normatīviem aktiem.
6.	Trauma no sprādzienbīstama priekšmeta.	6.1. Zemūdens darbu procesā var tikt uzieti sprādzienbīstami priekšmeti, kā rezultātā var tikt traumēti gan ūdenslīdēji, gan grunts padziļināšanas tehnika. 6.2. Padziļināmās teritorijas virsma ir iepriekš apsekojama un jāidentificē visi aizdomīgie priekšmeti, nepieciešamības gadījumā uz objektu izsaucot atbildīgos dienestus.

7.	Trauma no neatbilstošas gultnes padziļināšanas tehnikas ekspluatācijas	7.1. Gultnes padziļināšanas tehnikai ir jābūt darba kārtībā un pārbaudītai atbilstoši normatīviem aktiem. 7.2. Iekārtai ir jābūt piemērotai konkrētā darba veikšanai. 7.3. Personālam, kas veic darbu izmantojot padziļināšanas iekārtu ir jābūt apmācītiem un instruētiem darbam ar šo iekārtu.
----	--	--

Papildus riski būvuzņēmējam ir jāizvērtē un jāiekļauj DVP, darba aizsardzības plāna sadaļā.

Rasējumi

- 1

Materialu uzglabāšanas un tehnikas novietnes rakums:
- 2

Konteinerīša vagoniņi darbu vadītājam un strādnieku gērtuves:
- 3

Pārveļošanas WC:
- +

Vietā, kur atrodas pirmās palīdzības aptieciņa:
- !



Vietā, kur atrodas ugunsdzēsības stendi:
- ⊙

Vietā, kur atrodas glābšanas rīkijs:

DOP PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI:



- Būvaukuma pilsētiņas norobežojošais, moblais žogs:
- Materialu piegādes transporta kustība:
- Būvaukuma tehnikas pārveļošanas virzieni:

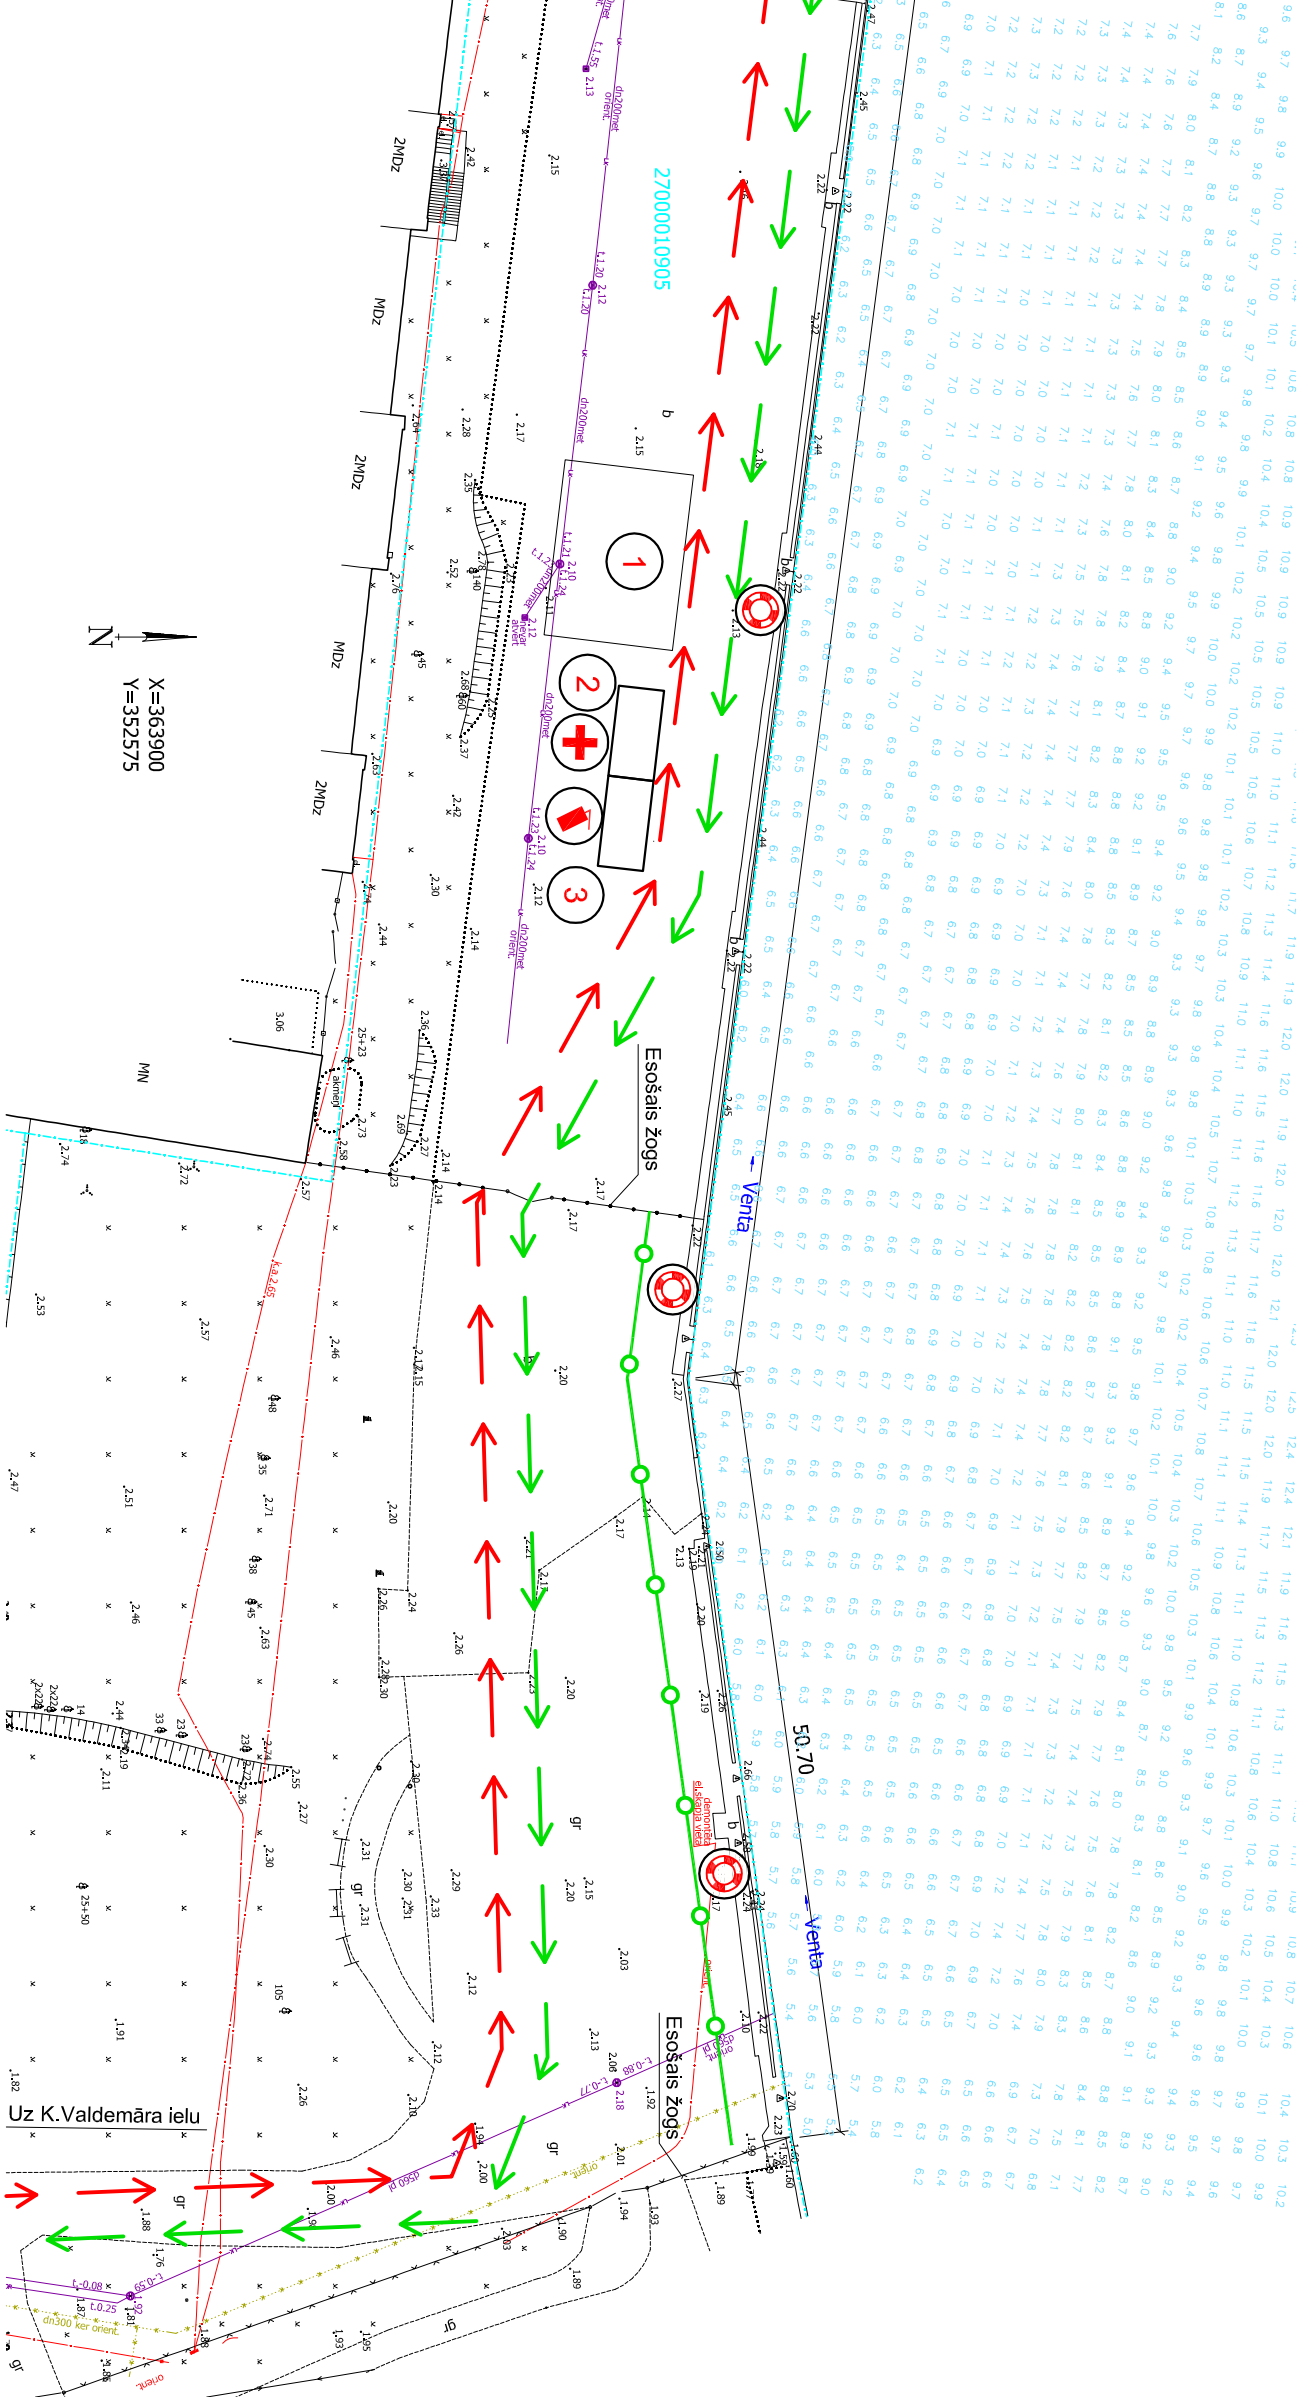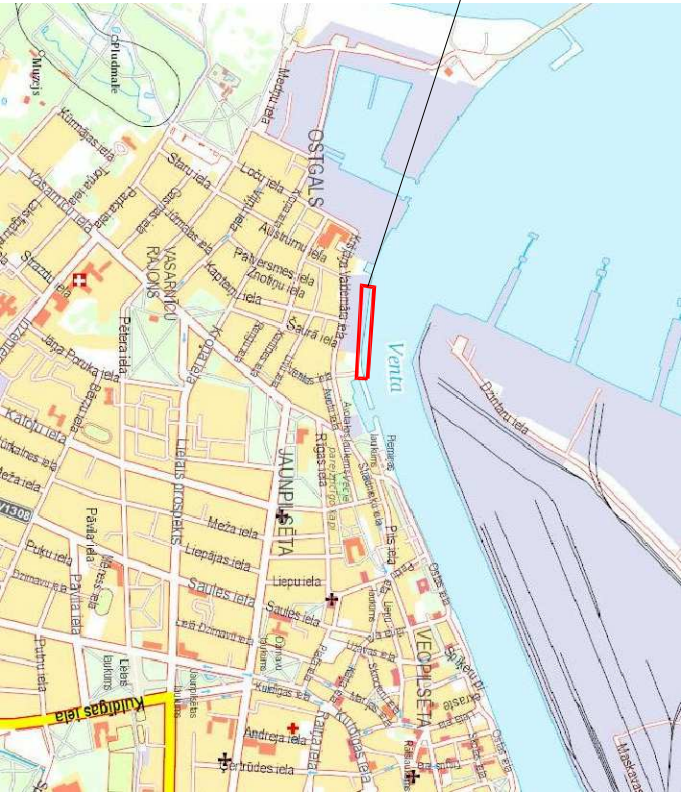SITUĀCIJAS PLĀNS



RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	Nosaukums	Ros. marka	Ros. Nr.
1.	Darbu organizācijas plāns un vispārīgā rādītāji	DOP	DOP-1
2.	Darbu shēma	DOP	DOP-2

Izstrādātājs  inženieru birojs KURBADA TILTI Baltu ielā 5, Rīga LV 1003 Tālrunis: 29424200, fakss: 29424230, GSM: 29499933 E-pasts: info@kurbada.lv, kurba.lv		Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde 	
Autors Būvprojekta vad. J.Rāzna Būvpr. daļas vad. V.Alekse-Bērziņa Pārbaudīja A.Razgais	Uzvārd Pāraksts	Projekta nosaukums Ventspils brīvostas pietātnes Nr.25 renovācija	
		Darbu organizācijas plāns un vispārīgā rādītāji	
		Pastiprinājuma nr. VBOP 2013/159	Arhīva nr. 179-HT13 Datums 24.01.2014 Mērogs 1:500 Stadija TP Ras. nr. DOP-1

2014.gada janvārī

Būvprojekta daļas vadītāja: Vīneta Alekno–Bērziņa




Būvprojekses sertifikāts: Nr.40–282

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Poskaidrojumi un piezīmes:


1. DOP plāns ir skatāms kopā ar šī projekta Vispārīgo daļu un BK daļām, kā arī ar DOP poskaidrojuma rakstu.
2. Pirms darbu uzsākšanas objektā būvuzņēmējam ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP).
3. Objektā ir jābūt izvietotiem uguns dzēsējiem aprīkoti ar to derīgumu atbilstošām atzīmē, kā arī veicot darbus gar ūdens moli, tuvumā ir jābūt izvietotiem glābšanas rīkiem.
4. Veicot darbus tiešā ūdens tuvumā un uz tā, darbiniekiem obligāti jānosēd peldvestes.

Čaulpāļu sadursēju remonts M1:150

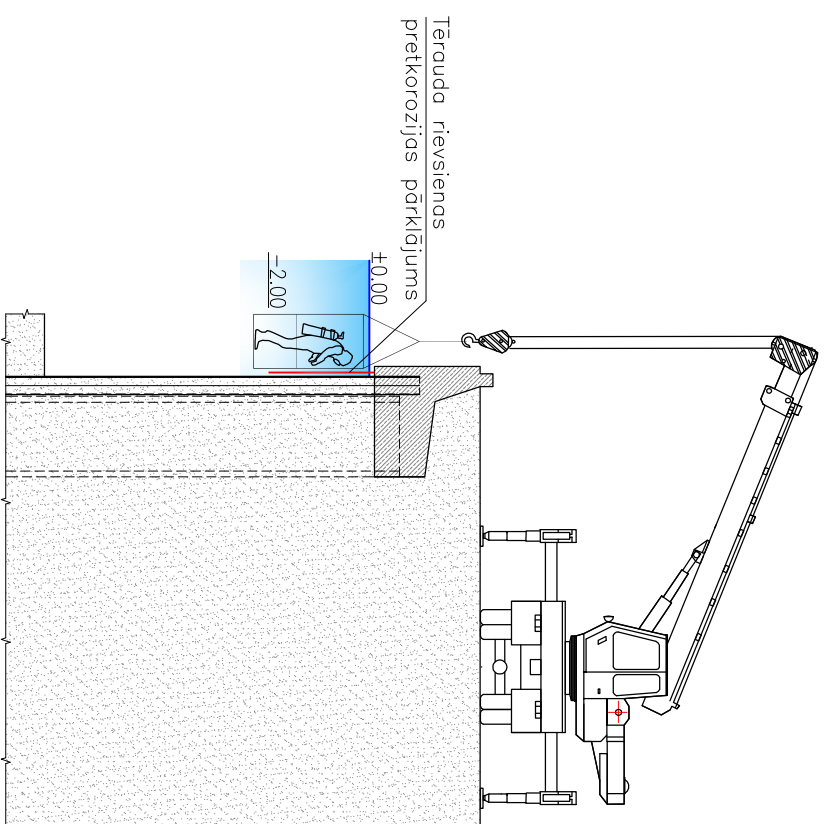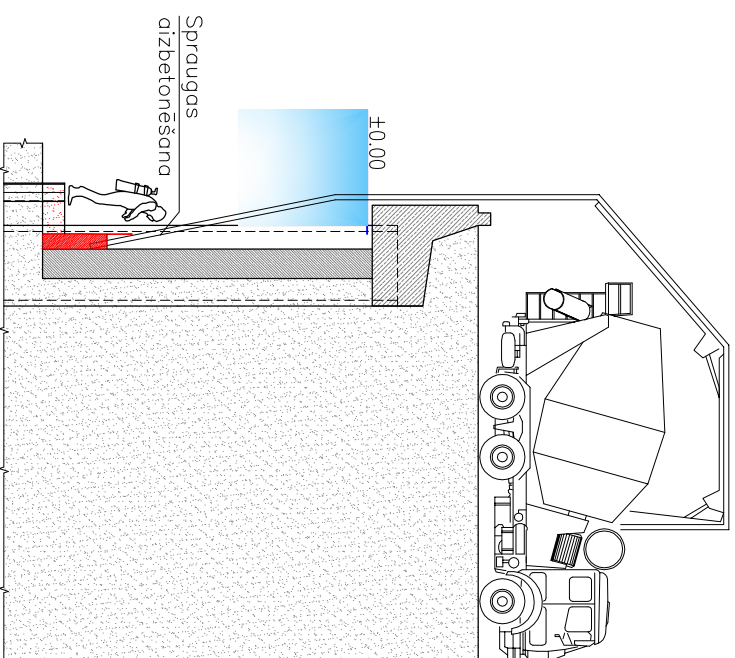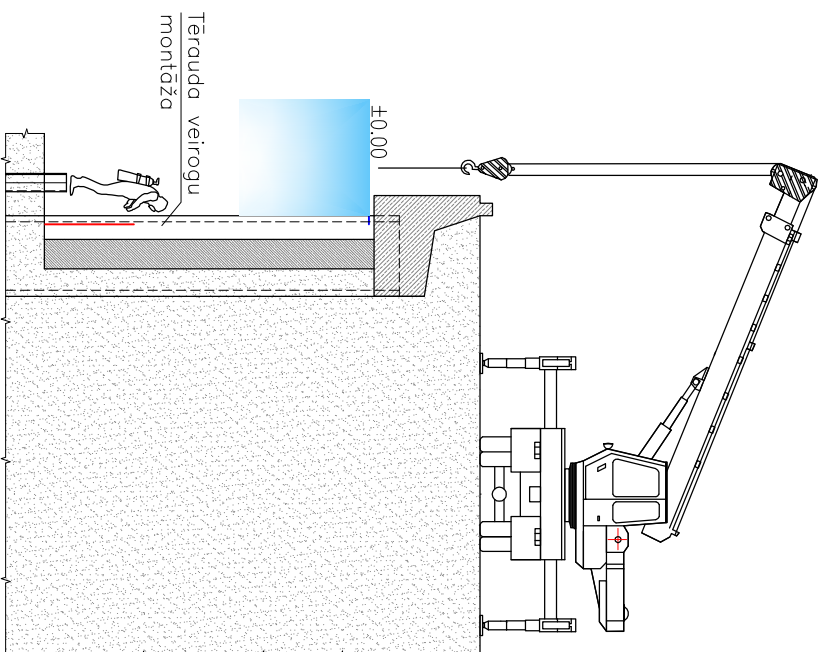


Tērauda rievsiens pretkorozijas pārklājuma izbūve M1:150


Čaulpāļu betona virsmas remonts M1:150

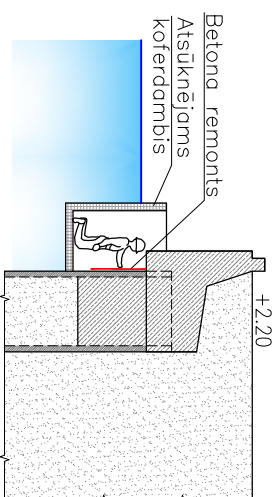

Dzelzsbetona virsbūves remonts M1:150

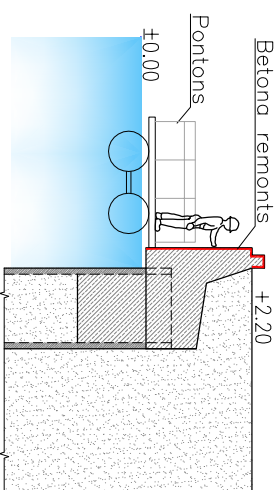

Piezīmes:
1. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes absolūtās m.

<div><div>inženieru birojs KURBADA TIL.TI</div></div> <div>Bakurbiņa 5, Rīga LV 1003 Tālrunis: 67334229, fakss: 67334230, GSM 29499933 e-pasts: info@kurbadatil.lv</div>			Pasūtītājs					
			Ventspils brīvostas pārvalde					
			Projekta nosaukums					
			Ventspils brīvostas pietāšnes Nr.25 renovācija					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Rasījums					
Buyr. daļas vad.			Darbu shēmas					
Projekcija	A.Razgalis		Pasūtītuma nr.	Arhīva nr.	Datums	Mērogs	Stadija	Ras. nr.
Pārbaudīja	M.Radovics		VBOP 2013/159	179-HT13	27.01.2014	1:150	TP	DOP-2
