

*Pasūtītājs:*

**Ventspils brīvostas pārvalde**

*Reģ. Nr.*

**LV90000284085**

*Adrese:*

**Jāņa iela 19, Ventspils**

*Līguma Nr.*

**198-T14**

*Būvprojekta nosaukums:*

**Ventspils brīvostas  
piestātnes Nr. 23 renovācija**

*Adrese:*

**Ventas kreisais krasts, Ostas ielas promenāde  
Nr. 215101**

*Būves klasifikācijas kods:*

*Sējums:*

**3. SĒJUMS Darbu organizēšanas projekts**

*Projekta stadija:*

**Būvprojekts**

*Uzņēmuma vadītājs/  
Būvprojekta vadītājs:*

**J. Rāzna**

*Būvprojekta DOP daļas  
vadītājs:*

**V. Alekna-Bērziņa**

*Būvprojekta autors:*

**SIA Inženieru birojs „Kurbada tilti”**

## BŪVPROJEKTA SASTĀVS

1. SĒJUMS      **VISPĀRĪGĀ DAĻA. ĢENERĀLPLĀNS**  
Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti. Paskaidrojuma raksts. Specifikācijas.  
Ģenerālplāns
2. SĒJUMS      **INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA. DARBU DAUDZUMU SARAKSTS**  
1. kārtā. piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija, piestātnes  
piekordona zonas seguma remonts  
2. kārtā. piestātnes kuģu atvairēlementu (fenderu) sistēmas renovācija
3. SĒJUMS      **DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS**
4. SĒJUMS      **EKONOMIKAS DAĻA (tikai 1. un 3. eksemplārā)**  
(Būvdarbu izmaksu aprēķins)

## SĒJUMA SATURS

1.	Paskaidrojumu raksts.....	4
1.1.	Esošās situācijas apraksts .....	4
1.2.	Darbu veikšanas projekts .....	4
1.3.	Sagatavošanās darbi .....	4
1.4.	Darbu secība .....	5
1.5.	Kalendārais grafiks .....	5
1.6.	Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana.....	5
1.7.	Vides aizsardzības pasākumi .....	6
2.	Drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumi. Darba aizsardzības plāns.....	7
2.1.	Vispārīgie norādījumi .....	7
2.2.	Iespējamie riski un pasākumi, kas veicami risku samazināšanai/novēršanai .....	8
	Rasējumi .....	9

## **1. Paskaidrojumu raksts**

### **1.1. Esošās situācijas apraksts**

Renovējamā piestātne atrodas Ventas upes kreisajā krastā starp piestātņi Nr. 22 un Nr.24 gar Ostas ielu. Projektētā platība ir izvietota zemes gabala ar kad.Nr. 27000020426 un robežās.

Objektam iespējams piekļūt no Ostas ielas un no Ventas upes.

### **1.2. Darbu veikšanas projekts**

Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, būvuzņēmējam ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts (turpmāk DVP).

DVP ir izstrādājams un saskaņojams ar Pasūtītāju atbilstoši LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", pamatojoties uz šo Darbu organizēšanas projektu un būvprojektu kopumā.

Izstrādājot DVP papildus ir jāņem vērā šādi normatīvie dokumenti:

- Darba likums;
- Būvniecības likums;
- Darba aizsardzības likums;
- Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”;
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.551 " Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus";
- MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi";
- MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu, darba aizsardzību un ugunsdrošību;
- MK noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.
- MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

Izstrādājot DVP būvuzņēmējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, izpildes metodes ņemot vērā ūdens līmeņa svārstības un viļņošanās, kā arī vējš, prasības kas ir minētas BK daļas paskaidrojuma rakstā, jāizstrādā detalizēts laika grafiks, kā arī jāizstrādā un jāsaskaņo ar attiecīgām institūcijām satiksmes organizēšanas plāns.

Būvuzņēmējam savās darbu izmaksās ir jāievērtē arī visu darbu veikšanai nepieciešamo atļauju (būvatļauja u.tml.) un saskaņojumu saņemšanas izmaksas.

### **1.3. Sagatavošanās darbi**

- 1) Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic ietekmējamās teritorijas rūpīga apsekošana un demontējamo elementu identificēšana.
- 2) Būvlaukuma materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukuma ierīkošana un labiekārtošana (ģērbtuvju, sanitāro mezglu ierīkošana) uz piestātnes (skat. lapu DOP-1, apzīmējums 1), tajā skaitā būvlaukuma norobežojošā žoga uzstādīšana.
- 3) Nepieciešamo elektropieslēguma vietu noteikšana, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķa skaitītāja uzstādīšana. Būvuzņēmējs autonomai elektroapgādei var izmantot arī mobīlos ģenerātorus.
- 4) Būvdarbu procesā ir jāveic izmantojamo materiālu krautņu vietu norādīšana un nepieciešamības gadījumā arī to sagatavošana, t.i virsmas atbrīvošana no traucējošiem elementiem (būvgružiem, akmeņiem u.t.t.) un nolīdzināšana.
- 5) Gan būvlaukuma pilsētiņai, gan pašam būvlaukumam diennakts tumšajā laikā ir jābūt apgaismotam.

- 6) Būvlaukumam ir jābūt norobežotam un apsargātam visu diennakti, nepieļaujot nepiederošu personu iekļūšanu tajā.

#### **1.4. Darbu secība**

Būvuzņēmējam visus darbu procesus, kas ir minēti šajā punktā (izstrādājot DVP) ir iespējams sadalīt vēl sīkāk, ievērojot galveno darbu procesu secību.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par objekta nodrošināšanu ar pietiekamu tehnikas un iekārtu daudzumu kvalitatīvai un drošai darbu veikšanai.

Ja būvdarbi tiek veikti pa kārtām vairākās sezonās, būvuzņēmējam jārēķinās ar nepieciešamību veikt mobilizācijas un demobilizācijas darbus katras no kārtām realizācijai, kā arī būvlaukuma sakārtošanas pēc būvdarbu pabeigšanas. Katrai no būvniecības kārtām ir izstrādājams atsevišķs Darbu veikšanas projekts.

#### **1. kārtā – piestātnes fasādes sienas un dzelzsbetona virsbūves renovācija, piestātnes piekordona zonas seguma remonts**

Remonta laikā paredzēts:

- labot iesēdumus piestātnes segumā;
- atjaunot dziļumus pie piestātnes;
- izveidot katodaizsardzības sistēmu tērauda rievsienu zemūdens daļai;
- izveidot tērauda rievsienu pretkorozijas pārklājumu no atzīmes -2.00 līdz dzelzsbetona virsbūvei;
- izveidot apbetonējumu tērauda rievsienu virsūdens daļā;
- domontēt esošo norobežojošo margu 1. posmā – remontēt bojātās vietas un uzstādīt atpakaļ (jā darbu veikšanai būvuzņēmējam nepieciešams demontēt margas 2. posmā, tad šos darbus būvuzņēmējs veic par saviem līdzekļiem).
- remontēt esošo dzelzsbetona virsbūvi ar remontjāvu.

#### **2. kārtā – „Piestātnes kuģu atvairielementu (fenderu) sistēmas renovācija”**

Esošās atvairierīces paredzēts demontēt un piestātni aprīkot ar universālām 1.5m garām ekstrudēta veida atvairierīcēm ar soli ~4m.

#### **1.5. Kalendārais grafiks**

Būvuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas sastāda izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku atbilstoši noslēgtā būvdarbu līguma nosacījumiem. Darbaspēka, mehānismu un būvmateriālu plūsma jāplāno tā, lai būvniecība iekļautos plānotajos termiņos:

- Savlaicīgi jāveic sagatavošanas darbi - DVP izstāde, materiālu saskaņošana, darba programmu izstrāde un saskaņošana, darba rasējumu sagatavošana un saskaņošana;
- Jāplāno būvdarbu mehānizācija un tehnoloģija;
- Jāizmanto plūsmas metode būvdarbu tehnoloģisko procesu veikšanai.

#### **1.6. Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana**

Katrs darbu process ir izpildāms atbilstoši šī projekta tehniskajās specifikācijās sniegtajām norādēm, par ko tiek sastādīti segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. Darbu izpildei pieļaujams izmantot tikai tādus materiālus, kas atbilst specifikāciju prasībām, par ko liecina materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas ar pielikumā pievienoto ražotāja izsniegto kvalitāti apliecinājošo sertifikātu.

Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga klātbūtnē. Nav pieļaujama situācija, kad tiek uzsākta nākamā darbu procesa izpilde, kamēr par

iepriekšējo darbu nav parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Saskaņotās izmaiņas ir reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā.

Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, būvuzņēmējam ir jāpieaicina sertificēts/licencēts mērnieks, kas veic izpildmērījumus, un šo izpildmērījuma plānu pievieno pie objekta izpilddokumentācijas.

Pēc visu darbu pabeigšanas objekts ir jāatbrīvo no materiālu atlikumiem, būvgružiem, informatīviem plakātiem un ceļa zīmēm, tehnikas u.tml. Būvlaukuma pilsētiņa jādemobilizē. Būvdarbu laikā visas skartās teritorijas ir jāsakopj, zālāji jārekultivē un objekts kopumā ir uzrādāms Pasūtītāja pārstāvim un/vai būvuzraugam, kā rezultātā var tikt sagatavots apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā.

### **1.7. Vides aizsardzības pasākumi**

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības likuma noteikumus un nepieļautu tās piesārņošanu. Veicot būvdarbus būvuzņēmējam jāņem vērā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi.

Būvniecības darbu procesā ir jāpielieto tādas darbu izpildes metodes, kas nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, t.i.:

- darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm,
- peldlīdzekļiem ir jābūt nodrošinātiem ar materiāliem (sorbetiem), ar kuru palīdzību nepieciešamības gadījumā var operatīvi lokalizēt degvielas un smērvielu noplūdi,
- jāveic pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu būvniecības procesā radušos putekļu daudzumu gaisā – sausā laikā piebraucamie ceļi ir jālaista,
- nodrošināt pasākumus, lai būvdarbu laikā netiktu pārsniegtas trokšņu emisiju pieļaujamās vērtības.
- mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt pēc iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību skaitu objektā, kas savukārt būtiski nepalielina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem.

Darbu izpildē ir izmantojami apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Būvmateriālu iesaiņojuma materiāli un citi būvniecības darbu procesā radušies atkritumi ir jāsavāc konteineros un jānodod attiecīgo atkritumu apsaimniekotājiem.

Būvprojekta DOP daļas vadītāja:

V.Alekna-Bērziņa

## **2. Drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumi. Darba aizsardzības plāns.**

### **2.1. Vispārīgie norādījumi**

Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs šim būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot un nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar atrašanos būvlaukumā.

Pirms darbu uzsākšanas, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, ir norīkojams atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir, vai nav, nozīmējis darba aizsardzības koordinatoru). Atbildīgajai personai licencētā mācību iestādē ir veicama atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, un ir apliecināti dokumenti/apliecības (LR MK noteikumi Nr.323 „Noteikumi par apmācību darba aizsardzībā jautājumos”).

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktaža, darba aizsardzības instruktaža darba vietā un ugunsdrošības instruktaža. Darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktažu/ apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam ir nozīmēts atbildīgais Būvdarbu vadītājs), saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu NR.323 “Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliccinās, vai ir apzinātas visas esošās komunikācijas - elektrolīnijas, sakaru gaisa un zemes kabeļi, ūdens un kanalizācijas caurules u.c.

Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt uz darba vietām tehnoloģiskā secībā, lai tādējādi nodrošinātu darba drošību.

Jebkādas iekārtas būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā.

Būvlaukumā lietotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju apliecināti dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecināti dokumenti/apliecības/sertifikāti.

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (speciālais apģērbs, apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas metodes un paņēmienus.

Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.125 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasības.

Sanitār-sadzīves telpām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai līdz būvdarbu uzsākšanai. Telpās ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri būtu nepieciešami cietušajiem pie pirmās palīdzības sniegšanas.

Būvuzņēmējam noteikti jāorganizē darbinieku apmācību/instruktažu, par drošu smagumu celšanu/pārvietošanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagus” prasībām.

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības inventāru, ugunsdzēsamiem aparātiem, glābšanas riņķiem un šo inventāru izmantošanas noteikumiem nepieciešamības gadījumā.

Būvniecības laukumā ir jābūt telefonu sakariem, lai varētu izsaukt glābšanas dienestus un neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Iebraucot būvlaukumā ir jābūt uzstādītai celtniecības laukuma shēmai. Grafiskie nosacījumi apzīmējumi ar atspoguļotām demontējamām būvēm, palīgēkām, izbrauktuvēm, piebrauktuvēm.

Būvlaukuma teritorijā smēķēšana ir atļauta tikai speciāli atvēlētās vietās.

## 2.2. Iespējamie riski un pasākumi, kas veicami risku samazināšanai/novēršanai

Nr. p.k.	Iespējamie riski	Pasākumi riska samazināšanai/novēršanai
1.	Darbinieku iekrišana ūdenī.	1.1. Darbiniekam, kas darbojas ūdens tuvumā vai uz ūdens, obligāti jānēsā glābšanas veste, bet darba platformai (piem.pontons) ir jābūt aprīkotai ar glābšanas riņķi. 1.2. Darbi veicami min.3 cilvēku grupā.
2.	Trauma no atlecošām šķembām.	2.1. Veicot tērauda griešanas darbus ir iespējams gūt traumu no atlecošām šķembām. Darbiniekam ir jālieto aizsargbrilles, aizsargapģērbs, speciāli apavi un darba cimdi.
3.	Trauma iekārtas neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā.	3.1. Darbu vadītājs pārliecinās par visu darba iekārtu gatavību darbam, pirms tās tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei. 3.2. Iekārtas kas aprīkotas ar spiedienu mērīšanas ierīcēm (manometri) ir jābūt derīgiem pārbaudes dokumentiem saskaņā ar likumu par bīstamo iekārtu ekspluatāciju. 3.3. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra veicamā darba specifiku un izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. 3.4. Darbiniekiem ir jābūt apmācītiem darbam ar katru konkrēto darba iekārtu/ierīci.
4.	Trauma no krītoša priekšmeta	4.1. Darbiniekam darba zonā obligāti jānēsā tam izsniegtie individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargķive, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi u.t.t.). 4.2. Brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst atrasties zem ceļamās kravas, vai celtņa izlices. 4.3. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši atestēts un ir atbildīgs par kravu stropēšanu.
5.	Trauma no neatbilstošas ūdenslīdēju aprīkojuma ekspluatācijas un neievērojot darba drošības instrukcijas.	5.1. Ūdenslīdēju birigādes vadītāja pienākums instruēt darba veicējus par katra konkrētā zemūdens darba specifiku un par pasākumiem, kas ir ievērojami darbu izpildes laikā. 5.2. Ūdenslīdējiem ir jābūt derīgām, kvalifikāciju apliecinošām, apliecībām. 5.3. Ūdenslīdēju aprīkojumam ir jābūt pārabadītam atbilstoši normatīviem aktiem.


Papildus riski būvuzņēmējam ir jāizvērtē un jāiekļauj DVP, darba aizsardzības plāna sadaļā.






DOP PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- |   |   |            |   |
|---|---|------------|---|
| 1 | Materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukums;           |            | Būvaukuma pilnērtības norobežošais, mobilais žogs |
| 2 | Konteinerlipa vagoninj darbu vadītājam un strādnieku ģērbtuves; |            | Materiālu piegādes transporta kustība;            |
| 3 | Parvietojamās WC;   |            | Būvaukuma tehnikas pārvietošanās virzieni;        |
| + | Vietā, kur atrodas pirmās palīdzības aptieciņa;                 |            | Uzstādāmās satiksmes organizācijas ceļa zīmes     |
|   | Vietā, kur atrodas ugunsdzēsības stendi.                        | 530<br>531 |   |
|   | Vietā, kur atrodas glabāšanas rīnķis;                           |            |   |

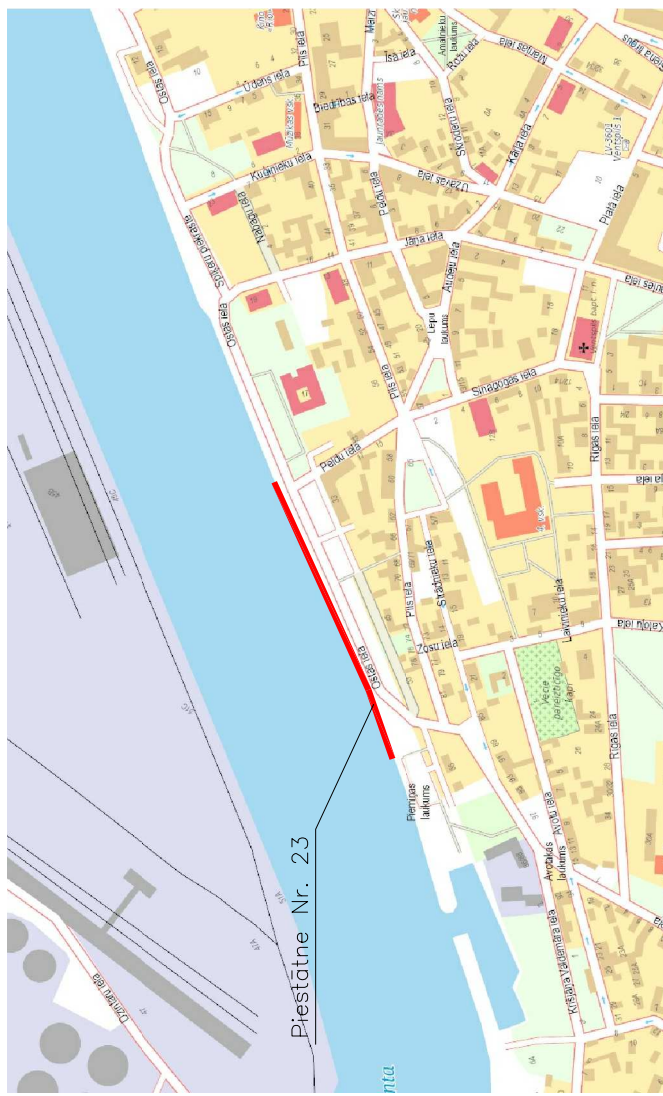

# DARBA ZONAS IZVIETOJUMS UZ PIESTĀTĒNES

Darba vietu aprīkot ar nepieciešamajām satiksmes organizācijas zīmēm

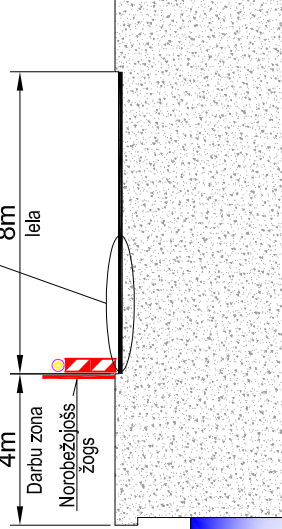

Nr.p.k.	Nosaukums	Ras. marka	Ras. Nr.
1.	Darbu organizācijas plāns un vispārīgie rādītāji	DOP	DOP-1
2.	Darbu shēma	DOP	DOP-2

RASĒJUMU SARAKSTS

Paskaidrojumi un piezīmes:

1. DOP plāns ir skatāms kopā ar šī projekta Vispārīgo daļu un BK daļām, kā arī ar DOP pasākdarījumu rakstu.
2. Pirms darbu uzsākšanas objektā būvuzņēmējiem ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP).
3. Objektā ir jābūt izvietotiem uguns dzēsīmajiem aparātiem ar to derīgumu atbilstošām atzīmē, kā arī veicot darbus gar ūdens malu, tuvumā ir jābūt izvietotiem glābšanas rīkiem.
4. Veicot darbus tiešā ūdens tuvumā un uz tā, darbiniekiem obligāti jānosēd peldvestes.
5. Darba vieta jāapkrīo ar ceļa zīmēm un satiksmes organizācijas līdzekļiem atbilstoši ministru kabineta noteikumiem Nr.421 – "Noteikumi par darba vietu apkrīošanu uz celiem".
6. Satiksmes organizēšanā ir dots principiāls shēmas risinājums, uzskāot būvniecības darbus ir jāizstrādā detalizēti un nepieciešamības gadījumā shēma jāsaskaņo ar ierītesētām institūcijām.
6. Ielas seguma remonta laikā un materiālu piegādēs laikā, kad darbi notiks uz ielas brauktuves darba vietu aprīkot atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 nodalī 6.2. Islaičio darbu vietas.
7. Ģor darba vietas nozōgumu uzstādīt vadstatņus.

 <b>inženieru birojs KURBADA ILDI</b> Bērnie iela 4, Rīga, LV 1003 Tālr. 67342420, faksārs 67342429, GSM 29439633 E-pasts: info@kurbadaildi.lv, kurbadaildi.lv	Pasūtītājs		Ventpsilpības pārvalde		
	Projekta nosaukums		Ventpsilpības pleslātnes Nr.23 renovācija		
Amats Uzvarde Paraksts Būvprojekta vad. J. Rāzna Būvpr. daļas vad. V. Alekna-Bērziņa Pabeidšana A. Rezgalis			Pasūtījuma nr. 200-HT14 198-T14 Arhīva nr. 200-HT14 Datums 09.02.2015 Mērogs 1:500 Stadija TP Ras. nr. DOP-1		


Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītājs: Vineta Alekna-Bērziņa  
Būvprakses sertifikāts: Nr.40-282


2015.gada  
.februārī .....



Dzelzsbetona virsbūves remonts M1:100

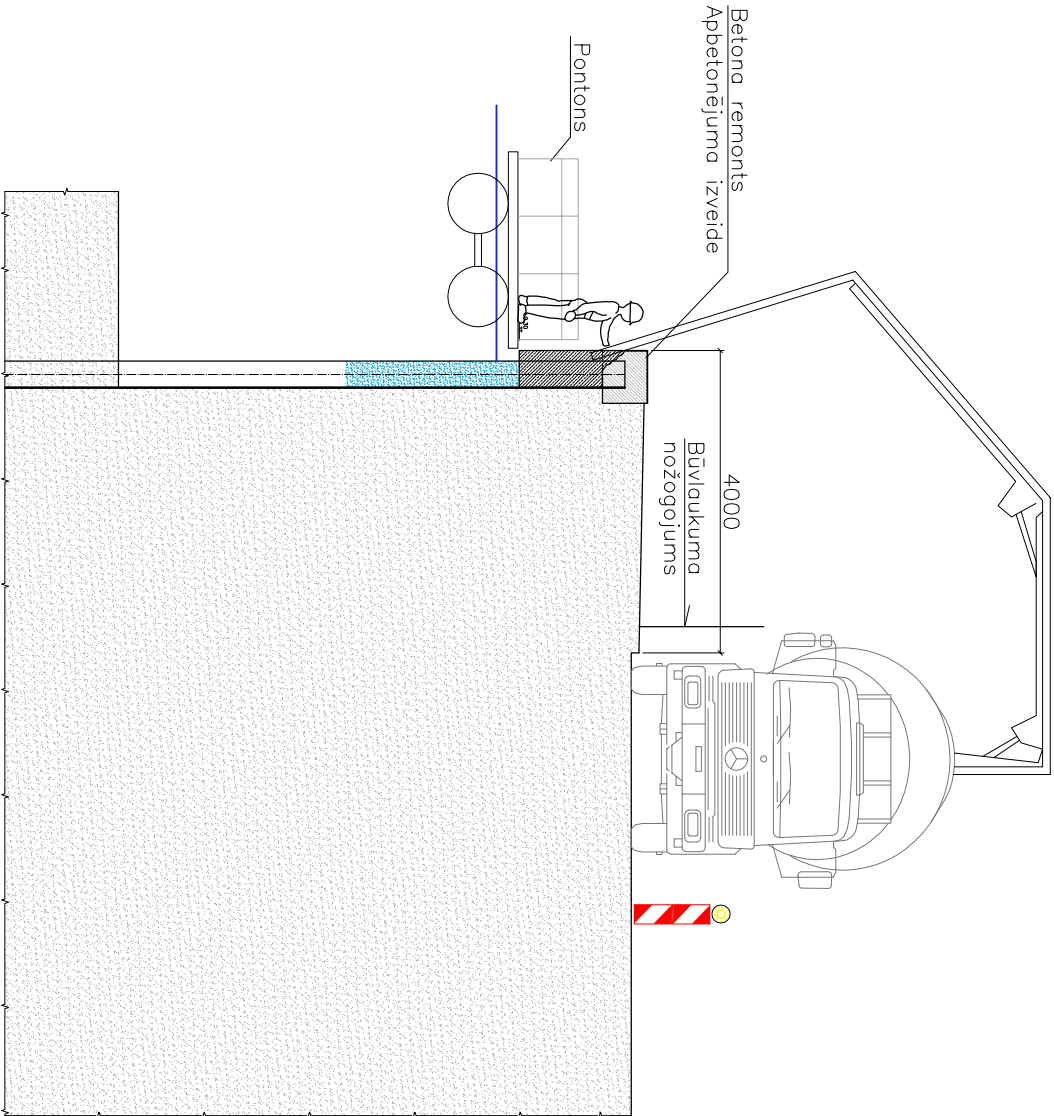

Tērauda rievienas pretkorozijas pārklājuma izbūve M1:100

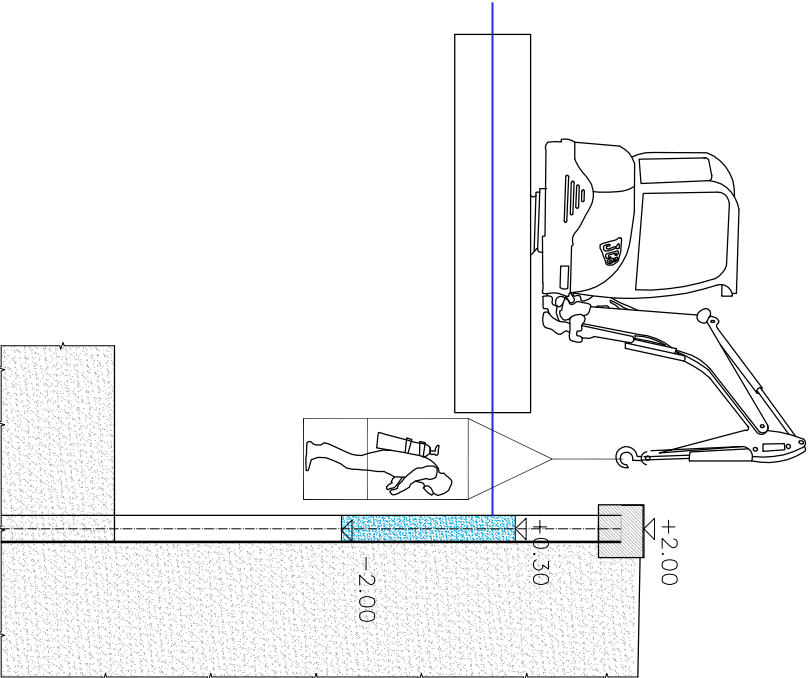

Piezīmes:  
1. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes absolūtās m.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div> <div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div> <div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div>
--
