

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI HLORĒTAVAS DEMONTĀŽAI

Hlorētaža celā no nesošām ķieģeļu mūra sienām, dz/b kolonnām un 12m garām dz/b sijām. Pārsegums no ribotiem dz/b paneļiem. Pamati sastāv no saliekamā betona blokiem.


Hlorētavas demontāžu veikt pretēji tās būvniecības secībai:

- demontēt, pārsegumu;
- nojaukt kļēģu mūra sienas un stāpstāvu pārsegumu;
- demontēt dzb sijas un kolonnas;
- demontēt grīdu, zemgrīdas kanālus un daļēju pamatus;


Darbu veikšanas laikā ievērot drošības tehnikas noteikumus un projekta daļās norādījumus. Īpaša vērtība jāpievērš:

- blakus esošo konstrukciju stabilitātei;
- darba drošībai ar mehānismiem un mehānizētiem darbarīkiem;
- dabu nodrošināšanai ar celtniecības normās un noteikumos paredzētiem individuālās drošības līdzekļiem;
- veikti saglabāto konstrukciju uzmērījumu un fotofiksāciju;


HIORĒTAVAS VIRSZEMES DAĻĀS DEMONTĀŽA

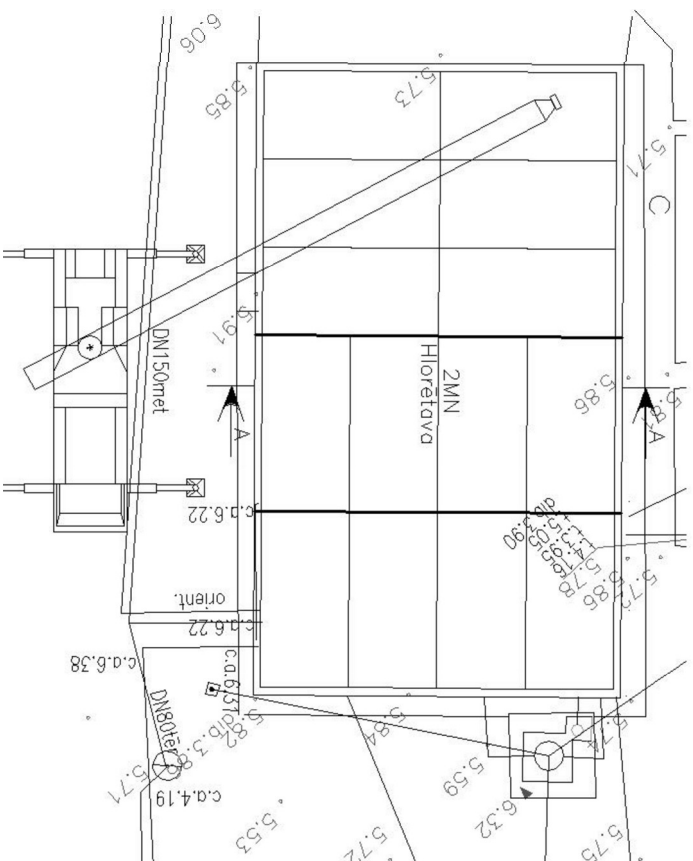

GRIEZUMS A - A

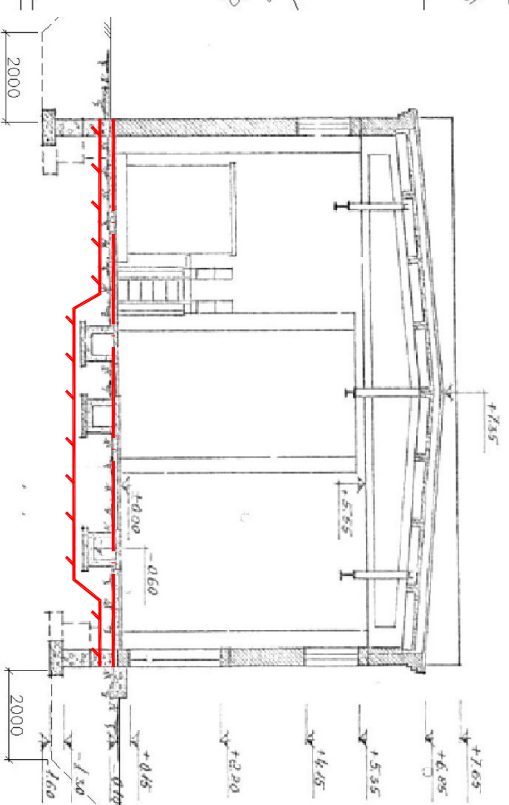

HIORĒTAVAS PAZEMES DAĻAS DEMONTĀŽA

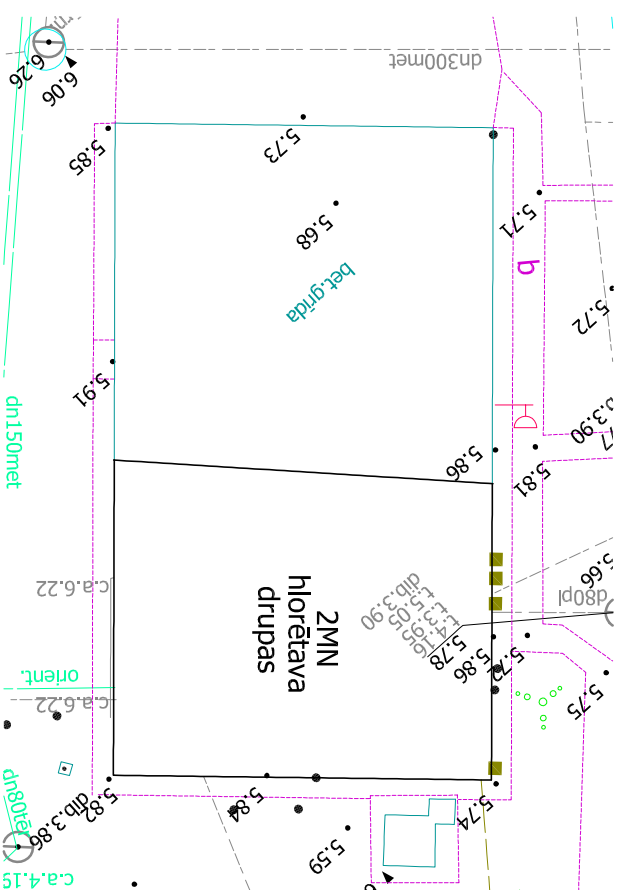

PIEZĪMES.

1. Vispārējais norādījums skatīt lapa Bn-1;
2. Darbu veikšanas laikā ievērot darba drošības noteikumus un projekta sadalās dotos norādījumus;
3. Īpašu vērību pievērst blakus esošo konstrukciju stabilitātes nodrošināšanai;



APZĪMĒJUMI.

Esošais zemes līmenis

Pamatu demontāžas līmenis

Aizbēruma līmenis

DEMONTĒJAMO ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA				
Elementa nosaukums	Marka	Izmēri, mm	Masa vienam elementam, t	Betona apjoms, m³
Pārseguma panelis		5980*3000*300	2.4	1.0
Kolonna		400*400*6000	2.6	1.1
Dzīb sija		12000	4.1	1.6

Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde, reģ. Nr. 90000284085, Jāņa iela Nr.19, Ventspils, LV-3601			
Objekts: "Bijušo plisētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Dzintaru ielā 68, Ventspilī"			
Amats		Uzvārds	Paraksts
Būvprojekta vadītājs		V. Bricis	01.11.2013.
Izstrādāja		V. Bricis	01.11.2013.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>HLORĒTAVAS DEMONTĀŽA</p> <p>/Poz. Nr. 7 ģenerālajā plānā/</p> </div> <div>  </div> </div>			
Projekta Nr.: 08-2013		Stadija	Lapa
		TP	BN-8
			24
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>0.158</p>  </div> <div> <p>inženertehniskie projekti.</p> </div> </div>			
