


 VentMet	Ziņojums par kuģa remontdarbiem		Kuģis "KAPTEINIS ORLE" Lapa 1 no 13
Datums 28.01.2019.	Sastādīja: Mārtiņš Ābelītis (paraksts)		




N.p.k.	Korpusa elements	Sāns	Garums	Platums	Biezums	Skats	Laukums	Svars	Piezīmes
			mm	mm	mm	gab.	m²	kg	
Ārējais apšuvums									
1	Loksne D1	Lab.	1600	6500	8	1	10.40	653.12	
2	Loksne E5	Lab.	1500	3200	6	1	4.80	226.08	
3	Loksnes D5, D6	Lab.	700	7700	6	1	5.39	253.87	
4	Loksnes C3, C4, C5	Lab.	1800	7700	6	1	13.86	652.81	
5	Loksne D8 (daļ.)	Lab.	1500	1800	6	1	2.70	127.17	
6	Loksnes C7, C8, C9, D9, D10	Lab., Kr.	2700	3200	8	2	17.28	1085.18	
7	Loksnes C10, C11	Lab.	1600	2000	10	1	3.20	251.20	
8	Loksne D11	Lab., Kr.	1400	2900	6	2	8.12	382.45	
9	Loksne D1	Kr.	1600	500	8	1	0.80	50.24	
10	Loksne D3	Lab., Kr.	1600	3600	8	2	11.52	723.46	
11	Loksne F7 (br.11 ÷ 22)	Kr.	1400	5600	6	1	7.84	369.26	
12	Loksne C3	Kr.	1800	1700	6	1	3.06	144.13	
13	Loksne C5 (daļ.)	Kr.	1200	1800	6	1	2.16	101.74	
14	Loksnes D8, D9	Kr.	1600	5500	6	1	8.80	414.48	
15	Loksnes C9, C10, C11	Kr.	1600	2900	10	1	4.64	364.24	
Kopā:						18 gab.	104.57 m²	5799.43 kg	

 V&V VentMet	Ziņojums par kuģa remontdarbiem		Kuģis "KAPTEINIS ORLE"
Datums 28.01.2019.	Sastādīja: Mārtiņš Ābelītis (paraksts)	Lapa 2 no 13	



N.p.k.	Korpusa elements	Sāns	Garums	Platums	Biezums	Skaitis	Eaukums	Svars	Piezīmes
			mm	mm	mm	gab.	m²	kg	
Ārējais apšuvums (stringera maiņa)									
1	Loksne A1	Lab., Kr.	1500	1800	8	2	5.40	339.12	
2	Loksnes A2, A3, A4 (Lab.) un A2 (Kr.)	Lab., Kr.	1000	2200	8	2	4.40	276.32	
3	Loksnes A5 (Lab.) un A3 (Kr.)	Lab., Kr.	1000	6000	8	2	12.00	753.60	
4	Loksnes A6 (Lab.) un A4 (Kr.)	Lab., Kr.	1000	1700	8	2	3.40	213.52	
5	Loksnes A7 (Lab.) un A5 (Kr.)	Lab., Kr.	1000	7000	8	2	14.00	879.20	
6	Loksnes A8, A9 (Lab.) un A6, A7 (Kr.)	Lab., Kr.	1800	3200	8	2	11.52	723.46	
7	Loksne B1	Lab., Kr.	1500	1600	8	2	4.80	301.44	
8	Loksne B2	Lab., Kr.	1600	2200	6	2	7.04	331.58	
9	Loksnes B3, B4 (Lab.) un B3 (Kr.)	Lab., Kr.	1700	6000	6	2	20.40	960.84	
10	Loksnes B5 (Lab.) un B4 (Kr.)	Lab., Kr.	1700	1700	6	2	5.78	272.24	
11	Loksnes B6, B7 (Lab.) un B5 (Kr.)	Lab., Kr.	1700	7000	6	2	23.80	1120.98	
Kopā:						22 gab.	112.54 m²	6172.30 kg	

		Ziņojums par kuģa remontdarbiem		Kuģis "KAPTEINIS ORLE"
Datums 28.01.2019.	Sastādīja: Mārtiņš Ābelītis (paraksts)			Lapa 3 no 13



N.p.k.	Korpusa elements	Sāns	Garums	Platums	Biezums	Skaitis	Laukums	Svars	Piezīmes
			mm	mm	mm	gab.	m²	kg	
1	Loksne A1	Centrs	1200	1600	6	1	1.92	90.43	
2	Loksnes B1, B2	Kr.	900	1300	5	1	1.17	45.92	
Starpsiena (39. branga)									
1	Loksne A2	Kr.	1700	1400	5	1	2.38	93.42	
2	Loksne A7	Lab.	1700	2700	5	1	4.59	180.16	
3	Loksnes C1	Centrs	1600	2000	8	1	3.20	200.96	
Enkuru kabatas									
1	Loksne A2	Kr.	1500	1500	8	1	2.25	141.30	
2	Loksne A3	Kr.	1700	600	8	1	1.02	64.06	
Klājs									
1	Loksnes starp brangām 11÷21	Centrs	6600	3000	6	1	19.80	932.58	
Brangas									
1	Brangas 48 ÷ 52	Lab., Kr.	2500	70	8	2	0.35	21.98	25 m
2	Brangas 38 ÷ 47	Lab., Kr.	5000	70	8	2	0.70	43.96	100 m
3	Brangas 3 ÷ 37 (stringera maiņa)	Lab., Kr.	2500	70	8	2	0.35	21.98	175 m
Kopā:								8 gab.	36.33 m²
Kopā:								48 gab.	1748.83 kg
Pavisam kopā:								253.44 m²	13720.56 kg
Kopā brangas: 300 m									


Piezīmes

Pēc Latvijas Jūras Administrācijas inspektora pieprasījuma tika veikti papildus mērījumi pakalpiņa garenvirziena sijām un brangām kā arī vizuālā pārbaude metinātajiem savienojumiem. Mērījumu rezultāti atspoguļoti testēšanas pārskatā Nr. NDT18-24.

Remontdarbu ziņojuma lapaspusēs Nr.8÷13 ir fotoattēli ar bojātiem kuģa elementiem, kuriem nav bijis iespējams veikt mērījumus un kas nav iekļauti ziņojumā vai testēšanas pārskatā.

 V&V VentMet	Ziņojums par kuģa remontdarbiem		Kuģis "KAPTEINIS ORLE"
Datums 28.01.2019.	Sastādīja: Martiņš Ābelītis (paraksts)		Lapa 4 no 13

Ārējais apšuvums (Labais sāns)

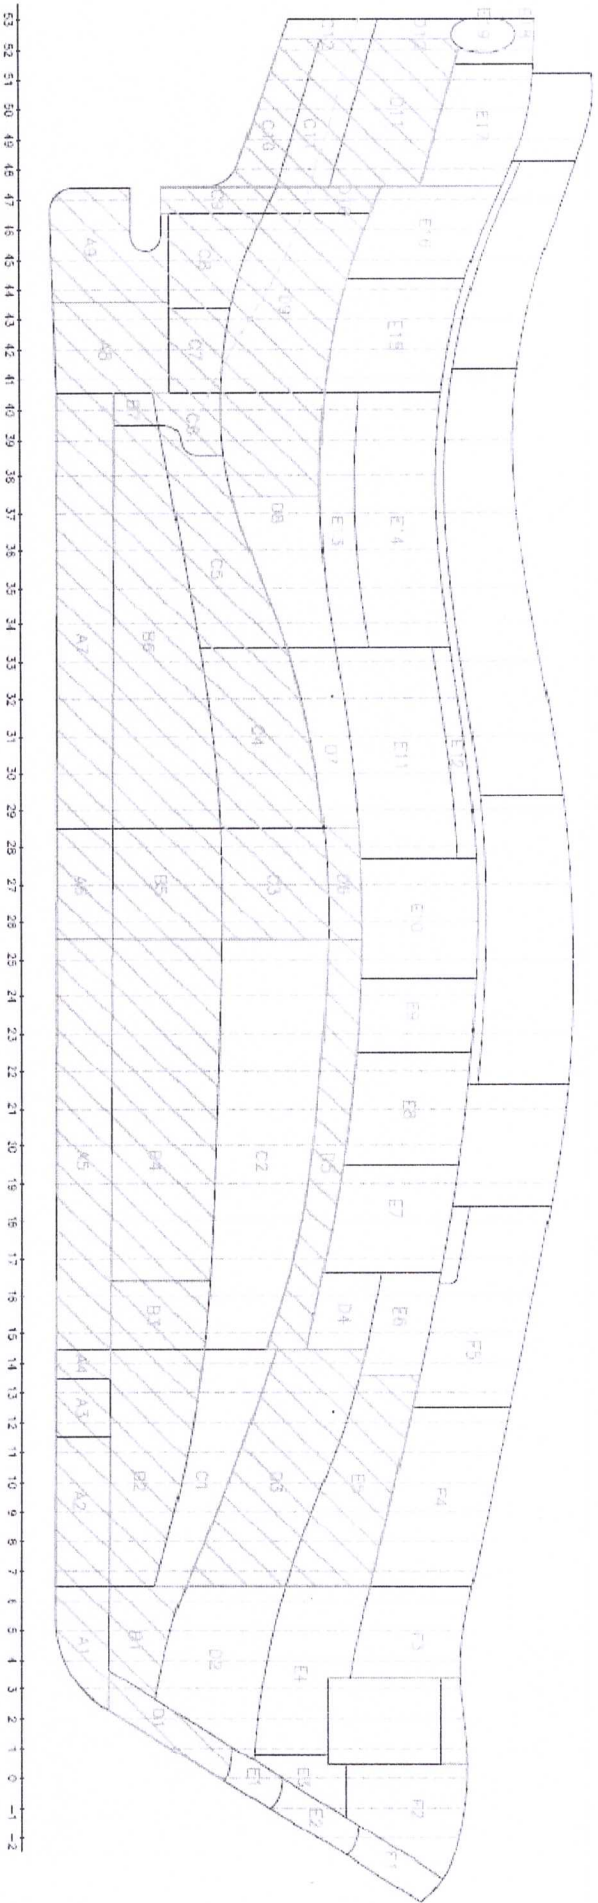

	Ziņojums par kuģa remontdarbiem		Kuģis "KAPTEINIS ORLE" Lapa 7 no 13
Datums 28.01.2019.	Sastādīja: Mārtiņš Ābelītis (paraksts)		

Starpsiena (39. branga)

