KONSTRUKTĪVI-TEHNOLOĢISKAIS RISINĀJUMS
VENTSPILS BRĪVOSTAS PIESTĀTNES NR.34 PĀĻA NR.3 UN NR.4 METĀLA RIEVSIENAS PASTIPRINĀŠANAI

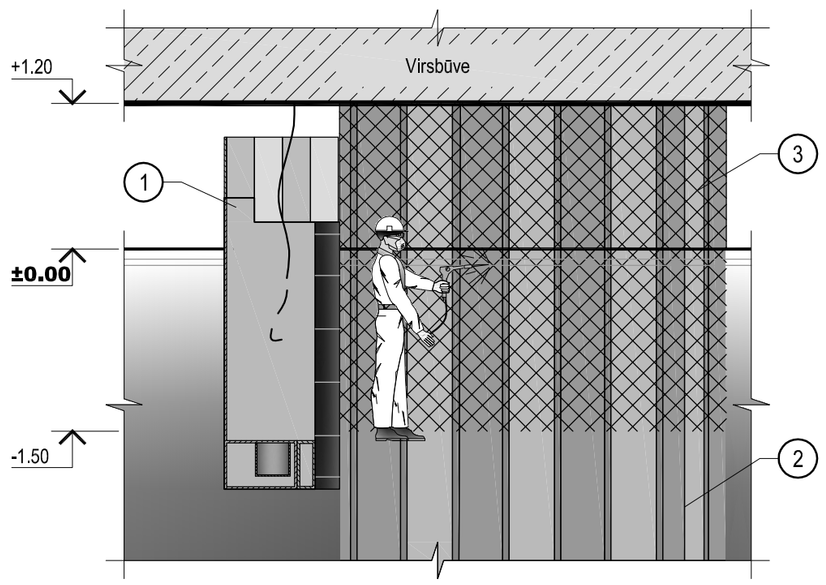

Paskaidrojums:
1. Hermokameras uzstādīšana darba stāvoklī.
2. Hermokameras uzstādīšanu izpilda ūdenslīdēju stacija.
3. Pirms remonta darbu izpildes metāla rievsienu attīra no apaugumiem.
   Izpilda rievsienas virsmas mehānisku attīrīšanu no korozijas produktiem.

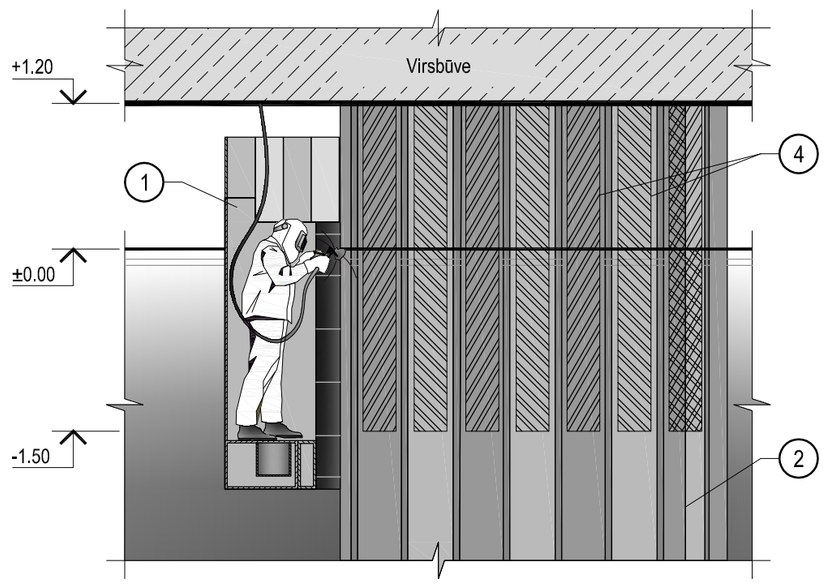

Paskaidrojums:
1. Pastiprināšanu veic ar metāla uzliktņiem (biezums 12mm), kurus piemetina pa esošās rievsienas kontūru.
2. Uzliktņus piemetina ar nepārtrauktu metināšanas šuvi pa visu metāla uzliktņu perimetru.
3. Metāla rievsienas pastiprināšanu veic ūdens mainīgā līmeņa zonā atzīmēs no +1,20m līdz -1,50m.

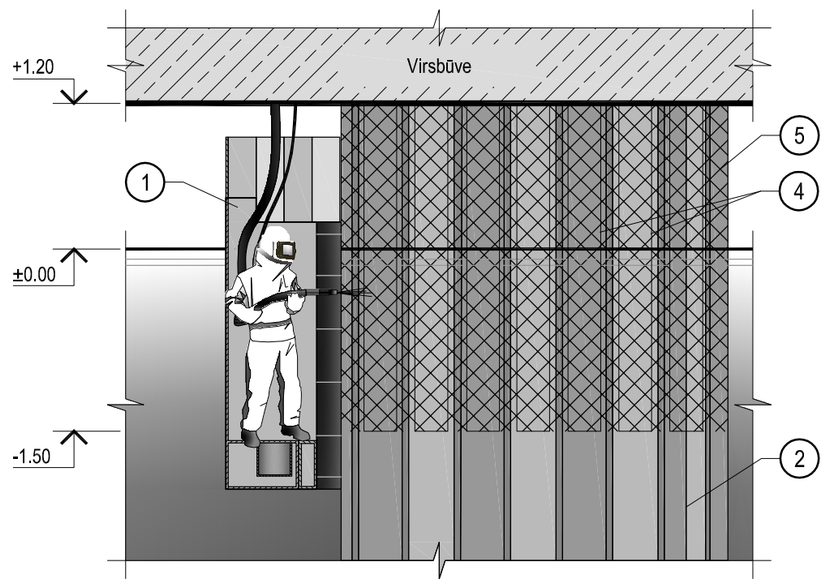

Paskaidrojums:
1. Pirms pretkorozijas pārklājuma uzklāšanas veic metāla rievpāļa kontura smilšstrūklošanu līdz pakāpei Sa 2½.
2. Virsmas sagatavošanas atzīmēs no +1,20m līdz mīnus 1,50m.

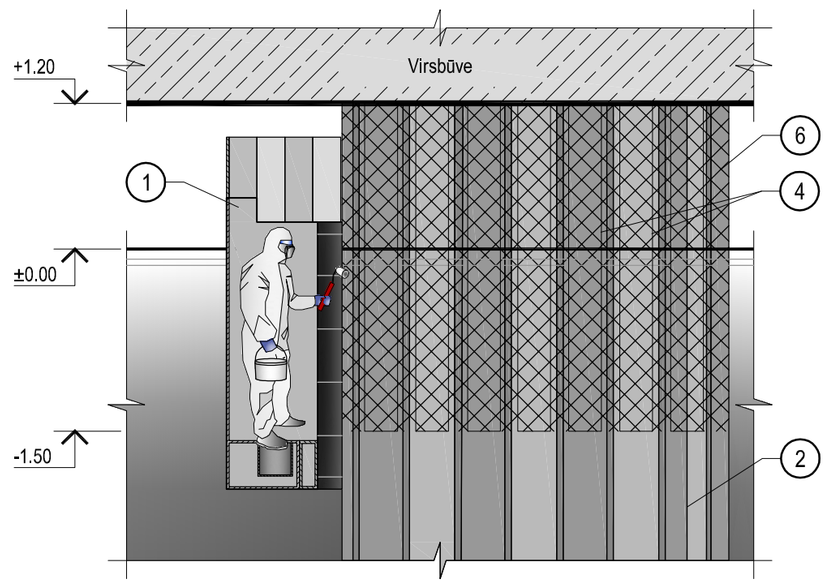

Paskaidrojums:
1. Projektā paredzēta pretkorozijas pārklājuma ierīkošana atzīmēs no +1,20m līdz mīnus 1,50m.
2. Pretkorozijas pārklājuma uzklāšanas darbu sastāvs un to izpildes secība:
   - Stelpant PU - Zinc (vai analogs) - 2 kārtas, katra 80 mkm.
   - Virsmas žāvēšanas pa kārtām.
   - Stelpant PU-Combination (vai analogs) - 2 kārtas, katra 170 mkm
   - Virsmas žāvēšana.
   - Stelpant PU-Cover W2 (vai analogs) - 1 kārta, 60 mkm.
   - Virsmas žāvēšana.

   Seguma kopējais biezums sastāda 560 mkm.
3. Hermokameras pārvietošana uz nākošo pozīciju.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

1. Hermokamera
2. Noslēgtas metāla rievpāļu Larsen-5 kontūrs
3. Apaugumi un gliemežvāki
4. Metāla uzliktņi
5. Smilšstrūklošanas apstrāde
6. Pretkorozijas pārklājums

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
GERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mailbox.lv

Projekta Nr.
12-23-HR

Pasūtītājs
VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Pr.d.vad.	J.Marnauza				
Projekt.	N.Harbredere				
Pārbaudīja	L.Stiopina				
Datums	28.03.2013				
Lapas arh.Nr.	Izm.	Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija. Dzintaru iela 78, Ventspils. 2.kārta.	Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
P-33259			TP	33259.dwg	
		Lapas nosaukums: Konstruktīvi-tehnoloģiskais risinājums pāļa Nr.3 un Nr.4 metāla rievsienas pastiprināšanai	Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
			HR2-9	uz lapas	
