FP-2001
M 1:20

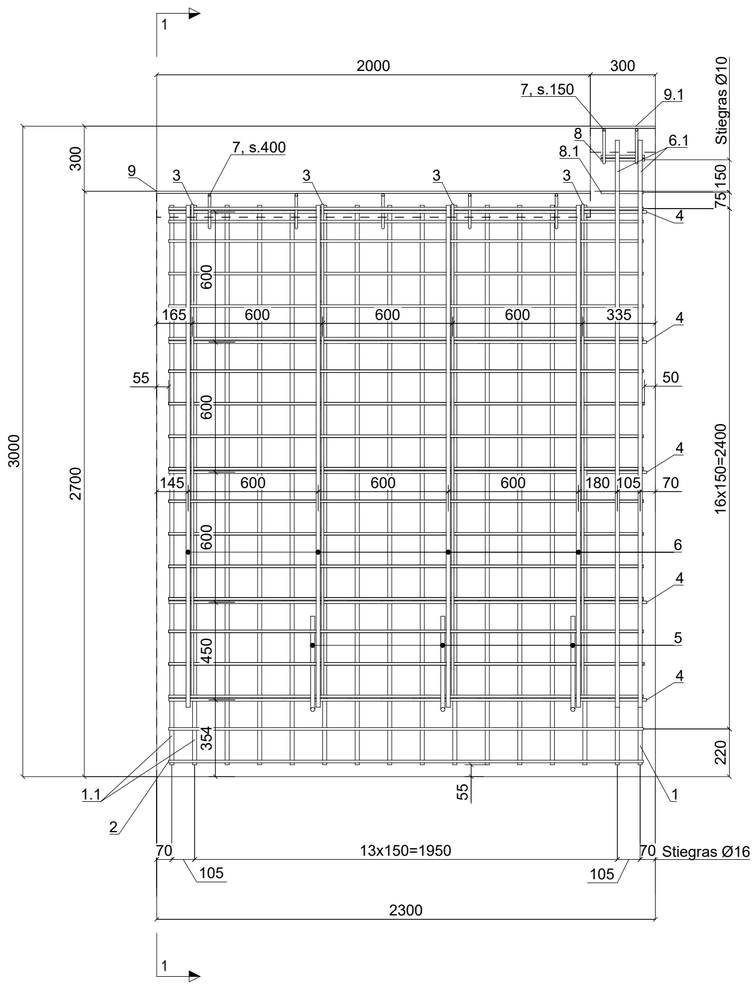

1 - 1
M 1:20

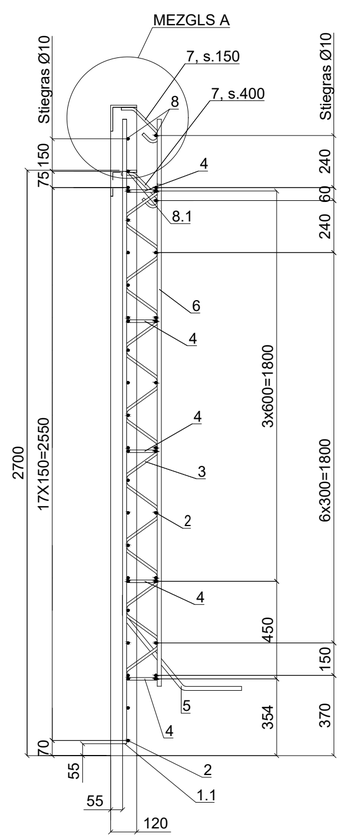

Poz Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg		Piezīmes
				1 poz.	Kopā	
		Stiegrojums				
1	LVS EN 10080	ø16mm, L=2580 B500B	14	4.08	57.07	
1.1	LVS EN 10080	ø16mm, L=2880 B500B	2	4.55	9.10	
2	LVS EN 10080	ø10mm, L=2190 B500B	28	1.35	37.77	
3	LVS EN 10080	ø10mm, L=3375 B500B	4	2.08	8.32	
4	LVS EN 10080	ø10mm, L=3020 B500B	5	1.86	9.30	
5	LVS EN 10080	ø16mm, L=790 B500B	3	1.25	3.74	
6	LVS EN 10080	ø16mm, L=2310 B500B	4	3.65	14.60	
6.1	LVS EN 10080	ø16mm, L=2610 B500B	2	4.12	8.25	
7	LVS EN 10080	ø10mm, L=320 B500B	7	0.20	1.38	
8	LVS EN 10080	ø10mm, L=200 B500B	2	0.12	0.25	
8.1	LVS EN 10080	ø10mm, L=190 B500B	1	0.12	0.12	
			Kopā Ø16 mm:		92.8	
			Kopā Ø10 mm:		57.1	
			Pavisam kopā:		**149.90**	
		Aizsargstūris				
9	S235J2W+N	L 120x120x10, L=2000	1	36.68	36.7	
9.1	S235J2W+N	L 120x120x10, L=300	1	5.50	5.5	
			Pavisam kopā:		**42.18**	
		Betons				
Kopā		C35/45 XS3+XF4	1	0.75	m^3	

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros;
2. Minimālais betona aizsargkārtas biezums 50mm, nominālais 55mm;
3. Visu metinājumu šuvju augstums ir 4mm, ja nav norādīts citādi;
4. Pacelšanas cilpas un plātņu stiprinājumus detalizē būvdarbu veicējs;
5. Veidņu plātnēm, fasādes sienām savstarpēji ir jābūt sastiprinātām pirms betonēšanas darbu veikšanas; Plātņu savatarpējos montāžas stiprinājumus un pacelšanas ciplas projektē būvdarbu veicējs;

BETONS SASKAŅĀ AR:

-LVS EN 206-2014 Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība
-LVS EN 13670:2010 Betona konstrukciju izgatavošana
-LVS EN 12620+A1:2009 Minerālmateriāli betonam
-LVS 156 Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 "Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība"

STIEGROJUMS:

- LVS 191-1, Tērauds betona stiegrošanai.
  Visās konstrukcijās pielietojams metināms periodiskā profila stiegrojums B500B.
- LVS EN ISO 17660, Metināšana. Stiegrojuma tērauda metināšana.

MEZGLS A
M 1:5

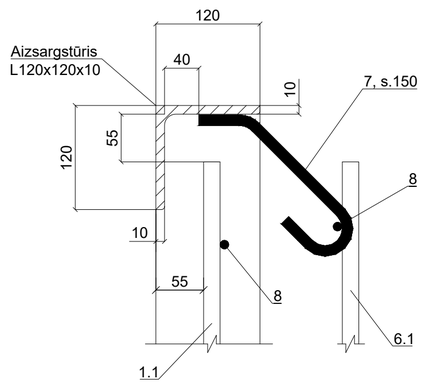

Poz.7

Poz.5



Poz.3
M 1:20



Poz.4
M 1:20



VERSIJA	IZMAIŅAS	DATUMS

PASŪTĪTĀJS:
Ventspils Brīvostas Pārvalde
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija
Tālrunis: +371 63622586
E-pasts: info@vbp.lv

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA "CHR Design Solutions"
Tvaika iela 27, LV-1005, Rīga, Latvija
Tālr. (+371) 22324435
E-pasts: info@chr.lv
Būvkomersanta reģ. Nr.14083

SADARBĪBĀ AR: SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti""
inženieru birojs KURBADA TILTI
Balvu iela 6, LV-1003, Rīga
Tālr. (+371) 67334229
e-pasts: info@kurbadatilti.lv
Būvkomersanta reģ. Nr.2624-R

OBJEKTA NOSAUKUMS:
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve, Ventspilī

PROJEKTA Nr.: 2021/50

STADIJA: BP

OBJEKTA ADRESE:
Latvija, Ventspils, Dzintaru iela 102C

BŪVPROJEKTA MARKA: HB

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
Atdurpālis Nr.3 Saliekāmo veidņu panelis Nr.FP/2001. 2. kārta.

RASĒJUMA Nr.: HB-25

MĒROGS: 1:5; 1:20

Būvproj.d.vadītājs:	E.Ovčiņņikovs		DATUMS: 02.09.2022
Izstrādāja:	M.Karnišauskis		LAPU SKAITS: / CAUR.Nr.:
Pārbaudīja:	E.Ovčiņņikovs		FAILA NOSAUKUMS: HB-25.dwg
			ARHĪVA Nr.: CHR/76 HB-25
